

An aerial photograph of a historic city center, likely in Europe, showing a dense cluster of buildings with red-tiled roofs and a prominent church spire. The text is overlaid on the image.

Prezentacja zadań realizowanych

przez

WYDZIAŁ

INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Wydział Infrastruktury Miejskiej



Nowe przestrzenie zdarzeń:

Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnobrzegu na potrzeby Tarnobrzegskiego Parku Doświadczeń

Planowany koszt – 10 782 465,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 550 049,01 zł

Rozpoczęcie prac styczeń 2019 r.

Zadanie obejmuje budowę i wyposażenie obiektu.

Obecnie trwają prace konserwatorskie przy zabytkowych polichromiach oraz prace restauratorskie przy elewacji budynku od strony płyty Rynku.

Planowane termin zakończenia zadania I kwartał 2021 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Nowe przestrzenie zdarzeń:

Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty.

Koszt planowany: 3 149 692,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 735,79 zł

Zadanie obejmuje budowę i wyposażenie obiektu.

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą robót budowlanych zaktualizowano dokumentację na pozostały zakres prac.

Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego.

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2020 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Nowe przestrzenie zdarzeń:

- Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej.
- **Koszt: 1 966 982,00 zł**
- **Wartość dofinansowania: 1 399 698,81 zł**
- Trwają prace przy wykonywaniu okładzin kamiennych placu i fontann.
- Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2020 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Nowe przestrzenie zdarzeń:

- Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Oświata:

Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnobrzegu o Salę Koncertową

Koszt: 28 440 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 000 000,00 zł

Zakończono prace budowlane i wyposażenie

Obecnie do zakończenia projektu brakuje intonacji i strojenia organów piszczalkowych



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Oświata:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15

Ogłoszono kolejne (trzecie) postępowanie przetargowe.

Szacowany koszt całości zadania ok 5 500 000,00 zł

Termin realizacji zadania II kwartał 2022 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Oświata:

Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31

Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne przy obiekcie.

Koszt: 1 069 296,98 zł

Termin realizacji zadania przełom II/III kwartał 2020 r.





Wydział Infrastruktury Miejskiej

Obiekt użyteczności publicznej:

Dom Kultury oś. Westerplatte

Koszt: 3 500 000 zł

Pozostało do wydania:

2020 r. – 100 000 zł

2021 r. – 1 649 357 zł

2022 r. - 1 649 358 zł

Dokonano wyboru wykonawcy.

Termin realizacji zadania II kwartał 2022 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Sport i rekreacja:

Opracowano dokumentację budowlaną dla zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu, ul. Zbylitowska 3”

Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji i wprowadzanie niezbędnych poprawek

Koszt - 597 444,00 zł



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Tereny zielone:

- Kontynuacja budowy oświetlenia w Parku Piaskówka
- Rozbudowa parku Westerplatte



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Tereny zielone:

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnobrzegu

Koszt: 9 634 075,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 944 365,87 zł

Trwają prace na terenie ogrodu sensorycznego

Planowany termin zakończenia projektu lipiec 2020 r.

Umowa podpisana marzec 2018 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Tereny zielone:

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnobrzegu



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Tereny zielone:

Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków

Koszt: 1 080 555,00 zł

Trwają prace wykończeniowe fontanny

Planowany termin zakończenia prac II kwartał 2020 r.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Kultura oraz ochrona zabytków:

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnobrzegu

Wartość dotychczas wykonanych robót - 3 471 982,50 zł

Zakończono II etap prac obejmujący dostawę i montaż stolarki okiennej.
W kolejnych etapach pozostało do wykonania instalacje co i elektryczne.



Wydział Infrastruktury Miejskiej



Przepompownia potoku Stary Wątok

Całkowita wartość projektu: 8 213 069,66 zł

Wartość dofinansowania 6 603 851,60 zł

Trwa procedura postępowania przetargowego



Wydział Infrastruktury Miejskiej



- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka- Komunalna”
Koszt - 15 816 850,00



Wartość dofinansowania 7 404 516,75 zł

Rozpoczęcie prac wrzesień 2018 r.

W roku 2019 zakończono I część realizacji SAG Piaskówka

Obecnie trwają prace na terenie SAG przy ul. Komunalna polegające na wycince drzew i krzewów oraz odhumusowanie.


Planowany termin zakończenia prac lipiec 2020 r.

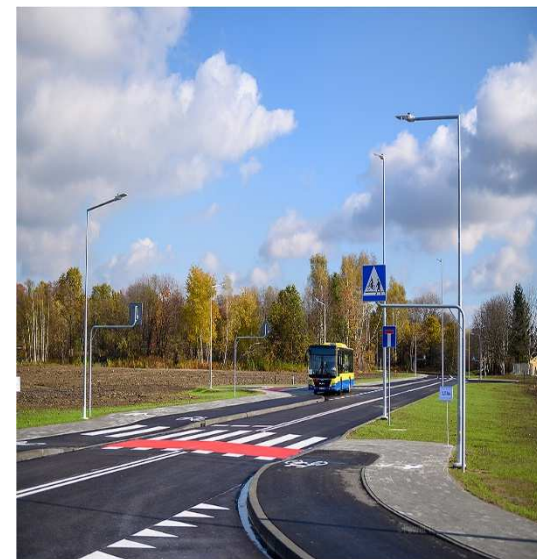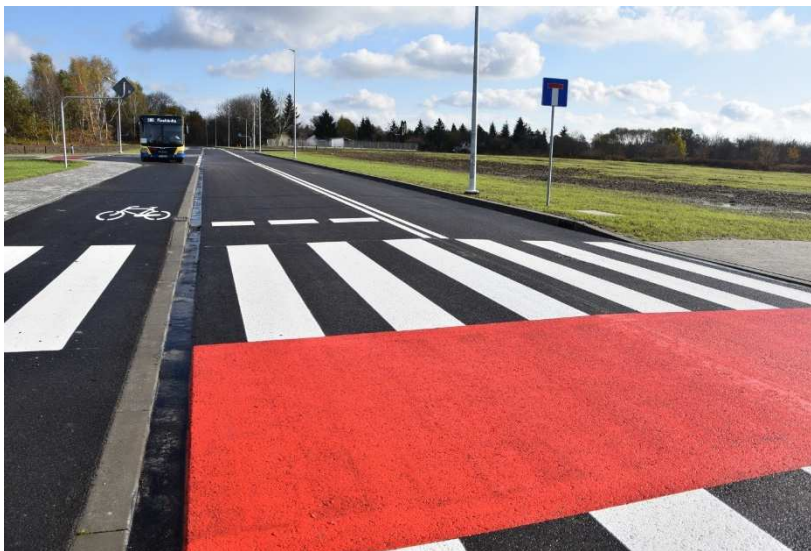




Wydział Infrastruktury Miejskiej

- Tężnia Góra Św. Marcina
- Opracowano dokumentację projektową
- Uzyskano pozwolenie na budowę
- Przygotowano postępowanie przetargowe
- Obecnie zadanie wstrzymane w dalszej realizacji

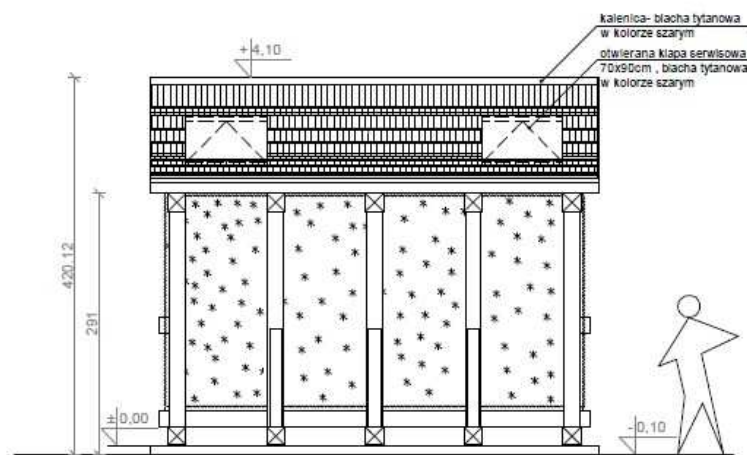

ELEWACJA ZACHODNIA
FRONTOWA

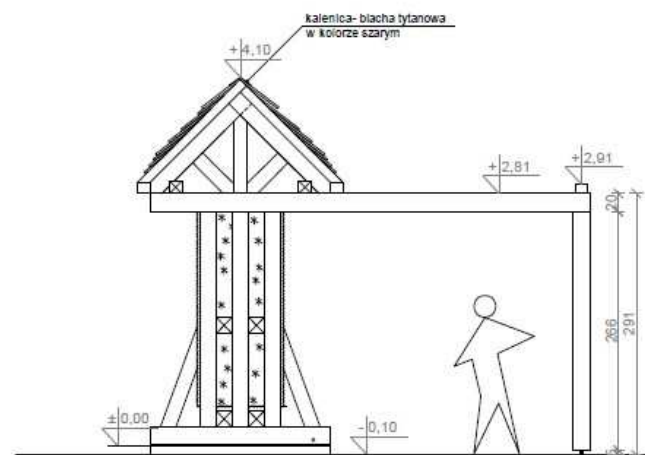

ELEWACJA POŁUDNIOWA





Wydział Infrastruktury Miejskiej

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Trwa procedura przetargowa w trybie dialogu konkurencyjnego





Wydział Infrastruktury Miejskiej

Aktualizacje dokumentacji na termomodernizację obiektów


1. Termo – ZSOiT Brodzińskiego 9
2. Termo- Zespół Szkół Budowlanych – Legionów 15
3. Termo – Ośrodek Geodezyjny przy ZSB ul. Legionów 15
4. Termo – Warsztaty szkolne ZSB ul. M.B. Fatimskiej 28
5. Termo Sz. Podstawowa nr 20 ul. Sportowa
6. Termo – szkoła nr 8 i Gimnazjum nr 4, ul. Bitwy pod Studziankami 5
7. Termo - ZSEO, ul. Sanguszków28





• Pozostałe zadania

- Trasy rowerowe – Góra Św. Marcina – opracowywanie dokumentacji projektowej
- Chodnik na Romanowicza - opracowywanie dokumentacji projektowej
- Boiska Terlikówka - opracowywanie dokumentacji projektowej
- Zadania Rad Osiedli na łączną kwotę ok. 350 000 zł.

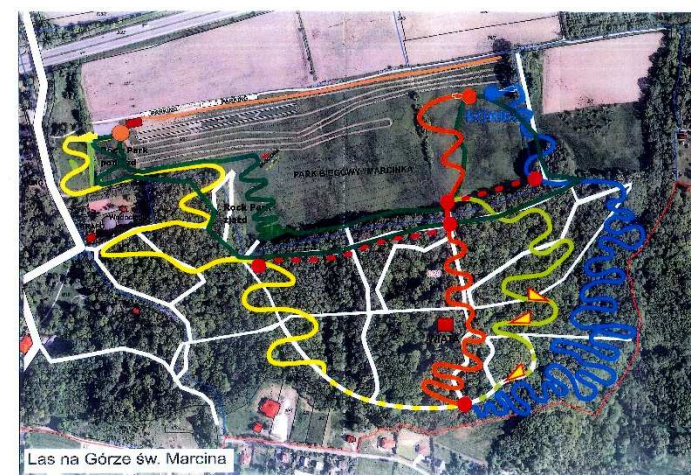

- - plac startowy
- - Trasa Pucharu MTB
- - I trasa
- - II trasa
- - III trasa
- - podjazd
- - łączniki
- - hopka

